

2.4土石方平衡

2.4.1表土剥离平衡及去向

根据现场调查,本项目占地范围内原地貌为住宅用地,项目区无可剥离表土,后期绿化时,对绿化区域先整地,再栽植乔灌木及花卉植物绿化。

2.4.2 主体工程土石方平衡

本项目挖方主要为区内建筑物基础开挖土方、管线开挖土方等;填方主要为场内建筑物基础回填土方、管沟回填土方、道路及广场区、绿化区域填筑土方等。

根据现场实际情况,本工程总挖方量 1.45 万 m³,总填方 1.45 万 m³,挖填平衡,无借、弃方。

本项目土石方平衡情况详见表 2.4-1。土石方流向框图见图 2.4-1。

表 2.4-1 主体工程土石方利用情况表 单位: 万 m³

工程分区	挖方	填方	利用方	调出	去向	调入	来源	余方
①建筑物工程区	0.92	0.65	0.65	0.27	道路广场区			0
②道路及附属设施区	0.35	0.62	0.62			0.27	建筑物工程区	0
③景观绿化区	0.18	0.18	0.18					0
合计	1.45	1.45	1.45					0

注: 余方由土方工程施工单位负责。

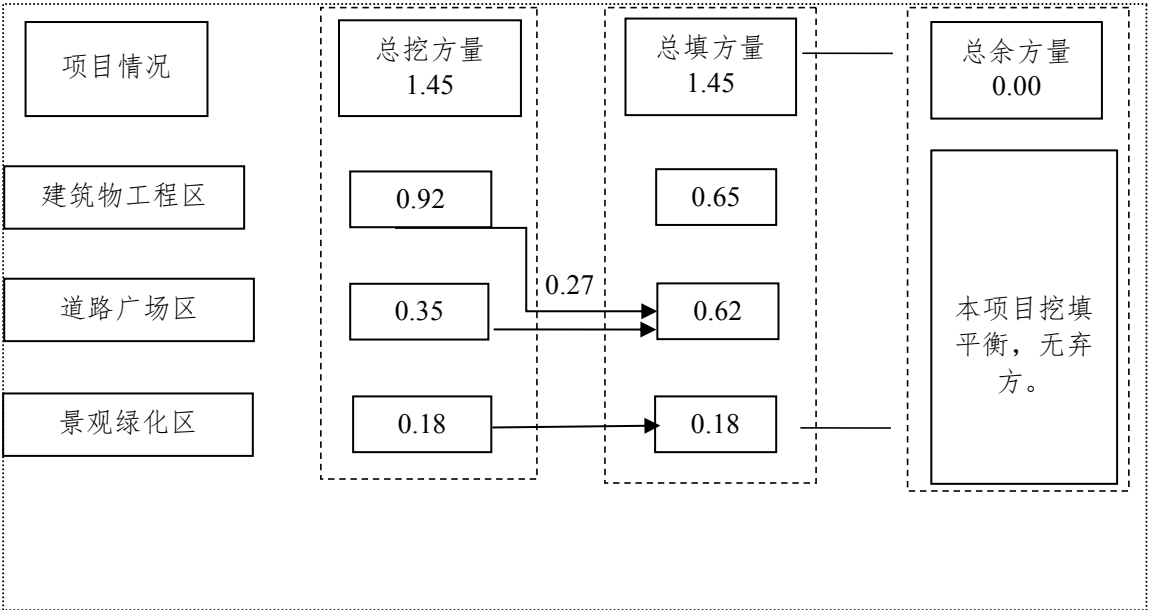


图 2.4-1 土石方平衡流向图 单位: 万 m³
